



РОСАТОМ



ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

Заказчик: Терукова Жанна Владимировна, директор

Проект:

**Оптимизация процесса
публикации новостей на
официальный сайт техникума**



Организационно-распорядительные документы



Министерство образования и науки Забайкальского края
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
(ГПОУ «ЧТОТнБ»)

ПРИКАЗ

№ 108

16.10.2025 года
по основной деятельности
О создании рабочей группы

В целях повышения эффективности деятельности ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» путем внедрения бережливых технологий в рамках реализации проекта «Эффективный регион» в Забайкальском крае
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по внедрению принципов бережливого производства, согласно Приложению к настоящему приказу в следующем составе:
Чумаков Н.С., руководитель ЦИТ;
Ларионов Э.А., менеджер по ИТ;
Филаткин А.А., старший лаборант ЦИТ;
2. Открыть проект по направлению «Оптимизация процесса публикации новостей на официальном сайте техникума».
3. Контроль, за исполнением настоящего приказа, оставляю за собой.

Директор

Ж.В. Терукова

Паспорт проекта

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

Оптимизация процесса публикации новостей на официальный сайт техникума

Подготовлено

Н.С. Чумаковым, руководитель ИТ-отдела



Утверждено

директор ИОУ «ЧТОТиБ»

Ж.В. Терукова

2025 г.

1. Вовлечённые лица и рамки проекта <i>Заказчик проекта:</i> Терукова Ж.В., директор. <i>Периметр проекта:</i> сотрудники техникума. <i>Границы процесса:</i> <u>Начало</u> – Написание новости. <u>Окончание</u> – Публикация новости. <i>Владелец процесса:</i> Чумаков Н.С., руководитель ИТ-отдела. <i>Руководитель проекта:</i> Чумаков Н.С., руководитель ИТ-отдела. <i>Команда проекта:</i> Чумаков Н.С., руководитель ИТ-отдела, Филаткин А.А., старший лаборант ИТ-отдела, Ларионов Э.А., менеджер по ИТ.			2. Обоснование выбора <i>Ключевой риск</i> – потеря времени сотрудниками ИТ-отдела на редактирование и обработку новости. 1. Временные потери на обработку материалов для новости. 2. Временные затраты специалистов ИТ-отдела на публикацию новости.														
3. Цели и плановый эффект <table><tr><th>Наименование цели, ед. измерения</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>Вероятность ошибки при составлении новости, %</td><td>78</td><td>2</td></tr><tr><td>Временные затраты ИТ-специалиста, мин</td><td>16</td><td>0</td></tr><tr><td>Процесс корректировки новостного контента, мин</td><td>14</td><td>2</td></tr></table> Плановый эффект: - сокращение временных затрат специалистов ИТ; - сокращение временных потерь инициатора новости; - повышение уровня удовлетворенности сотрудников и пользователей за счет упрощения и ускорения процесса публикации новостей.			Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Вероятность ошибки при составлении новости, %	78	2	Временные затраты ИТ-специалиста, мин	16	0	Процесс корректировки новостного контента, мин	14	2	4. Ключевые события проекта 1. Начало проекта – 02 сентября 2025 г. 2. Анализ текущей ситуации проекта: - разработка карты текущего состояния процесса – 02-18 сентября 2025 г., - поиск и выявление проблем – 17-24 сентября 2025 г., - разработка целевой карты процесса – 24 сентября-01 октября 2025 г., - разработка «дорожной карты» проекта – 01-08 октября 2025 г. 3. Реализация мероприятий «дорожной карты» – 10-20 октября 2025 г. 4. Мониторинг достигнутых результатов проекта – 20-22 октября 2025 г. 5. Завершение проекта – 23 октября 2025 г.		
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель															
Вероятность ошибки при составлении новости, %	78	2															
Временные затраты ИТ-специалиста, мин	16	0															
Процесс корректировки новостного контента, мин	14	2															

Команда проекта




Чумаков
Никита Сергеевич,
Руководитель ИТ отдела

Филаткин Андрей
Александрович,
Старший лаборант ИТ отдела

Ларионов
Эдуард Александрович,
Менеджер ИТ отдела

Карта текущего состояния процесса

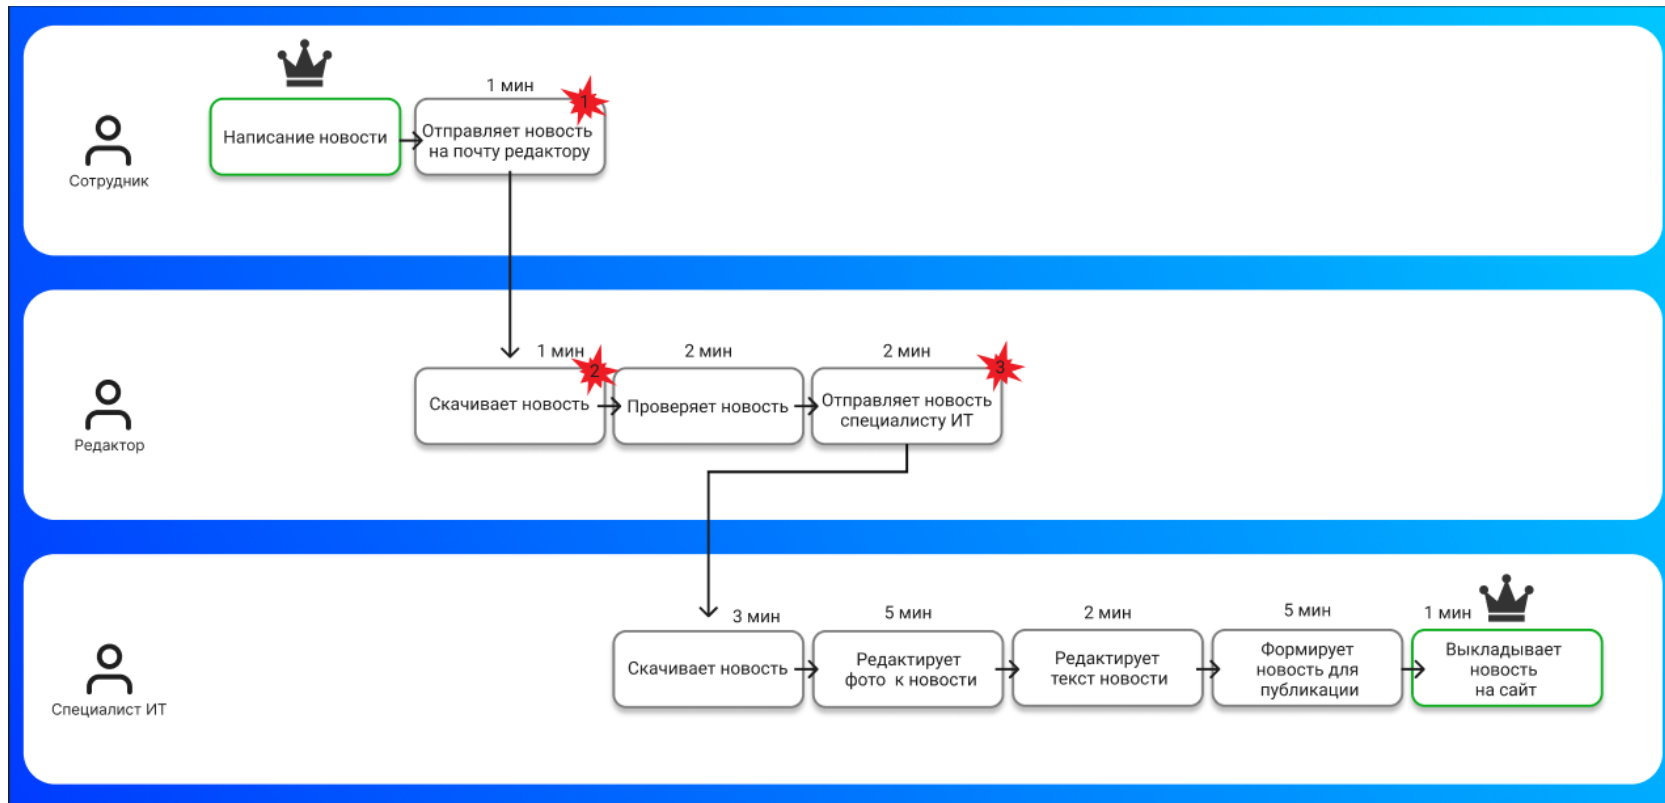


— ВПП: 22 мин

Текущие проблемы



1. Некорректная подготовка и отправка новостей на неверные адреса электронной почты.
2. Неоптимизированный процесс корректировки новостного контента.
3. Неоправданные временные затраты IT-специалиста.

Карта идеального состояния процесса

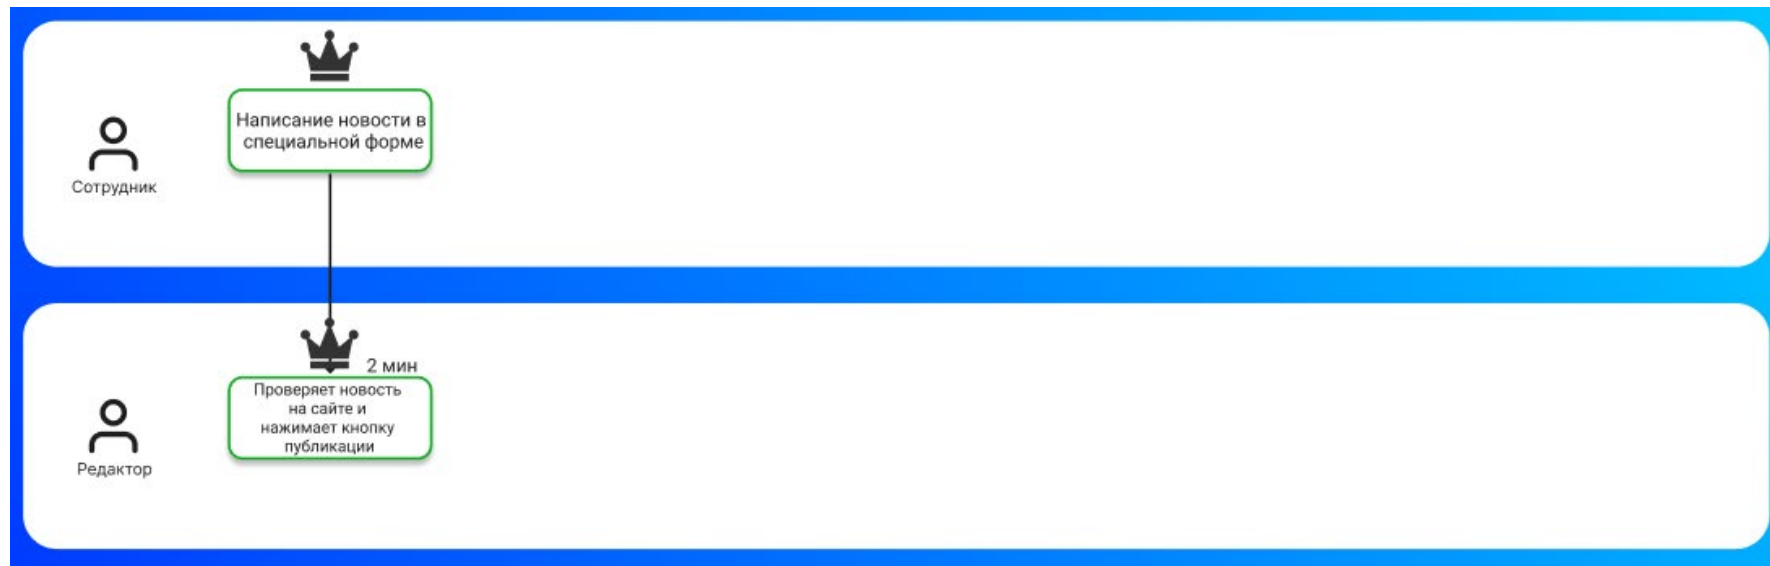

— ВПП: 2 мин

Выявление коренных причин методом «5 Почему?»



Проблема 1

Некорректная подготовка и отправка новостей на неверные адреса электронной почты

Почему?

Отсутствие понимания или знаний о требуемой форме

Почему?

Коренная причина

Отсутствует четкий алгоритм публикации новостей

Проблема 2

Неоптимизированный процесс корректировки новостного контента

Почему?

Сотрудники обрабатывают новости в стороннем редакторе, где отсутствуют подсказки или стандартизированные шаблоны

Почему?

Коренная причина

Отсутствие автоматизированной системы для подготовки новостей в установленном формате

Проблема 3

Неоправданные временные затраты IT-специалиста

Почему?

Участие IT-специалиста в процессе подготовки и отправки новостей не является необходимым

Почему?

Коренная причина

Отсутствие интерфейса для публикации новостей, сложности с самостоятельной публикацией новостей редактором

Пирамида проблем



Подготовка к плану действий




Проблема	Решить полностью	Решить частично	Решение не планируется	Другое
Проблема 1. Некорректная подготовка и отправка новостей на неверные адреса электронной почты				
Проблема 2. Неоптимизированный процесс корректировки новостного контента				
Проблема 3. Неоправданные временные затраты IT-специалиста				

Вклад в цель проекта

№	ПРОБЛЕМА	ПЕРВОПРИЧИНА	ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ	ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ	%
1	Некорректная подготовка и отправка новостей на неверные адреса электронной почты	Отсутствует четкий алгоритм публикации новостей	Разработка формы для заполнения новостей на сайте с использованием встроенного текстового редактора	Сокращение вероятности ошибок	100
2	Неоптимизированный процесс корректировки новостного контента	Отсутствие автоматизированной системы для подготовки новостей в установленном формате	Создание удобного интерфейса для редактирования новостей на сайте	Сокращение временных затрат	100
3	Неоправданные временные затраты IT-специалиста	Отсутствие интерфейса для публикации новостей, сложности с самостоятельной публикацией новостей редактором	Разработка удобного интерфейса для самостоятельной публикации новостей редактором	Сокращение временных затрат	100

Карта целевого состояния процесса

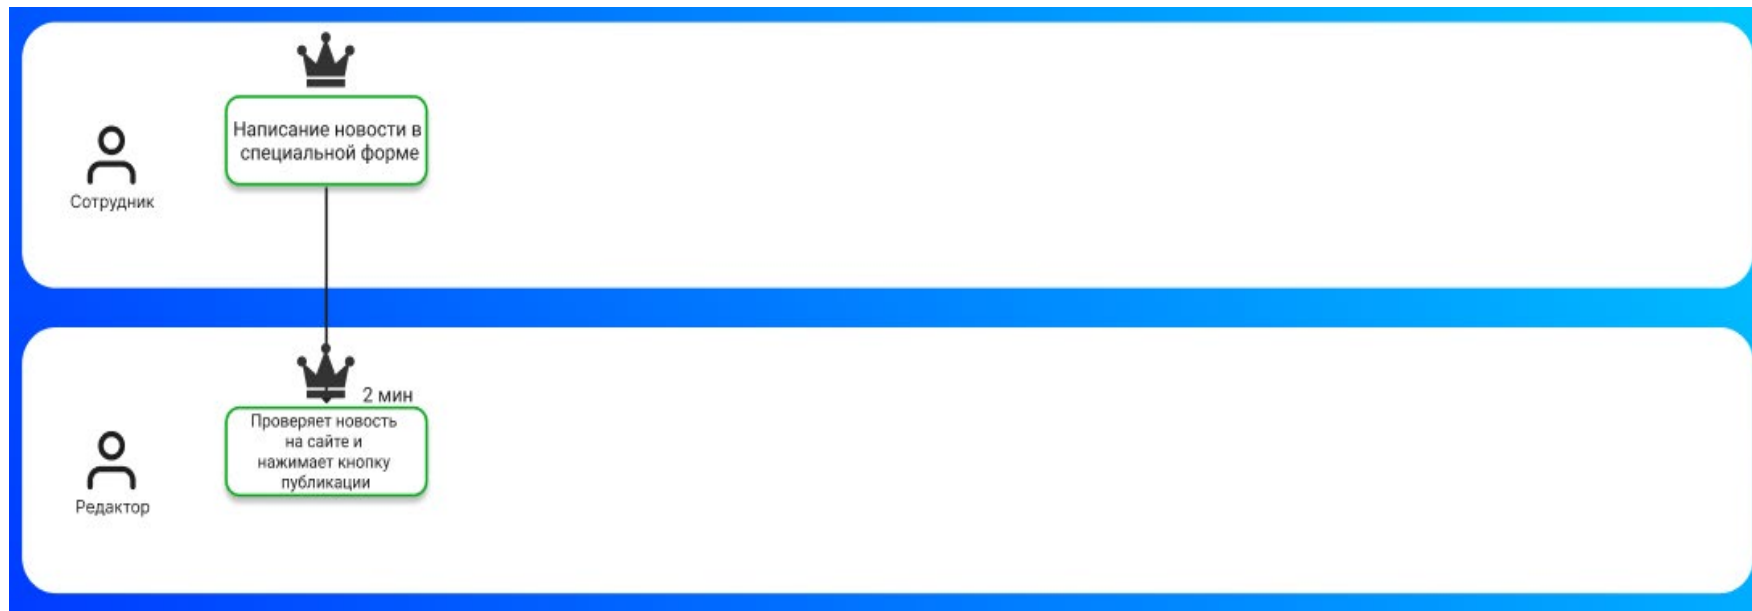


— ВПП: 2 мин

План мероприятий по реализации проекта



Проблема	Предлагаемое решение	Ответственные	Срок	Исполнение
Некорректная подготовка и отправка новостей на неправильные адреса электронной почты	Разработка формы для заполнения новостей на сайте с использованием встроенного текстового редактора.	Чумаков Н.С.	24.09.2025-15.10.2025	
Неоптимизированный процесс корректировки новостного контента	Создание удобного интерфейса для редактирования новостей на сайте	Чумаков Н.С.	24.09.2025-19.10.2025	
Неоправданные временные затраты IT-специалиста	Разработка удобного интерфейса для самостоятельной публикации новостей редактором	Чумаков Н.С.	24.09.2025-23.10.2025	

Реализация мероприятий

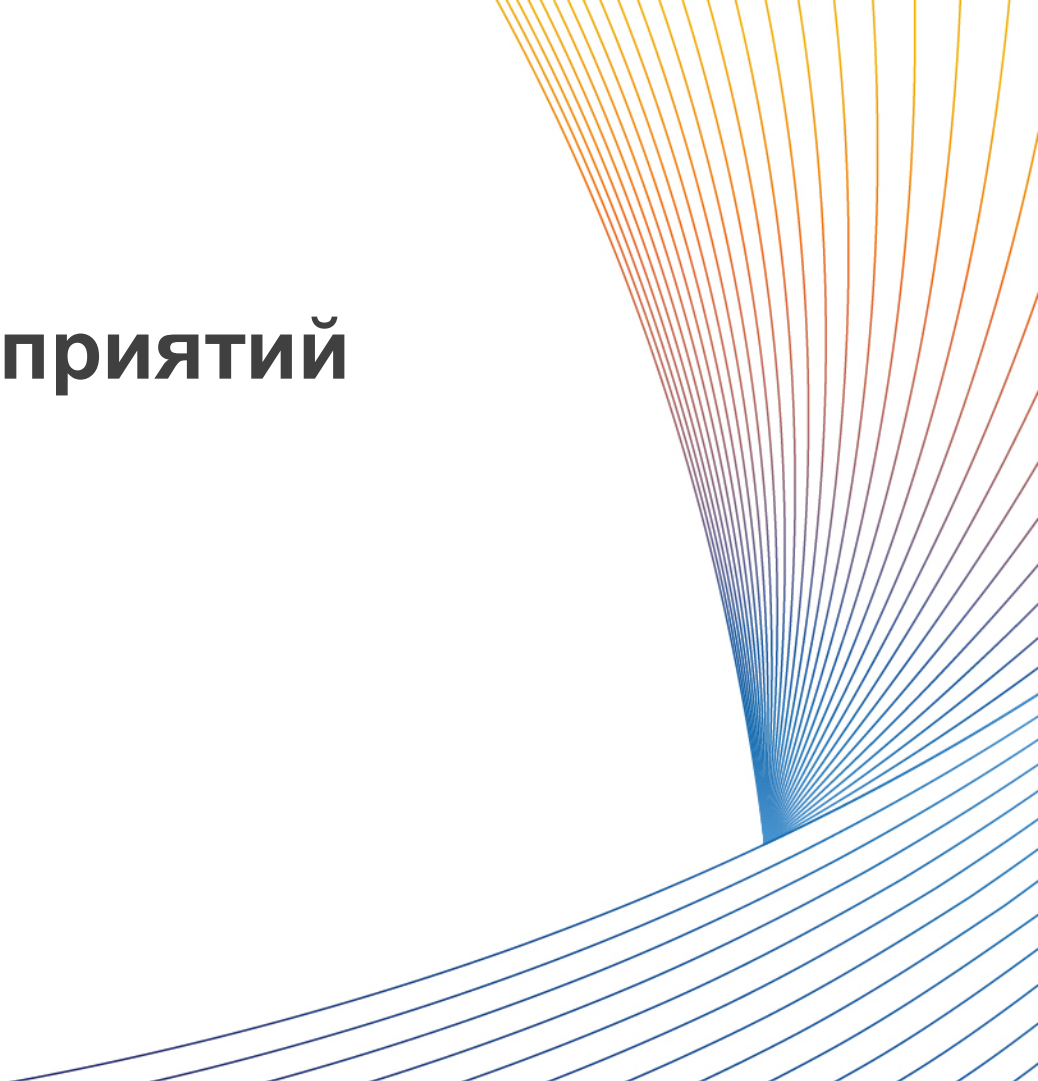

Проблема 1. Некорректная подготовка и отправка новостей на неверные адреса электронной почты




Решения:

Разработка формы для заполнения новостей на сайте с использованием встроенного текстового редактора


Результат:

Форма для написания новостей на сайте разработана



Главная страница
сервиса

Текстовый редактор
для новостей



Проблема 2. Неоптимизированный процесс корректировки новостного контента




Решения:

Создание удобного интерфейса для редактирования новостей на сайте

Результат:

Интерфейс для редактирования новостей создан

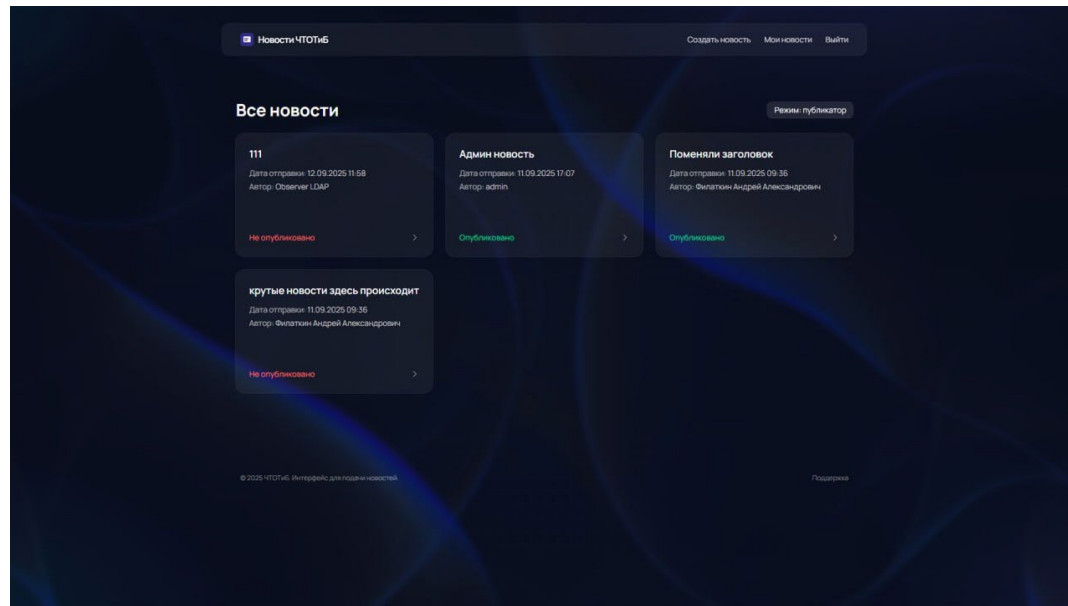

Проблема 3. Неоправданные временные затраты IT-специалиста



Решения:

Разработка удобного сервиса для самостоятельной публикации новостей редактором

Результат:

Создан сервис для публикации новостей, что исключает работу IT-специалиста

Отображение

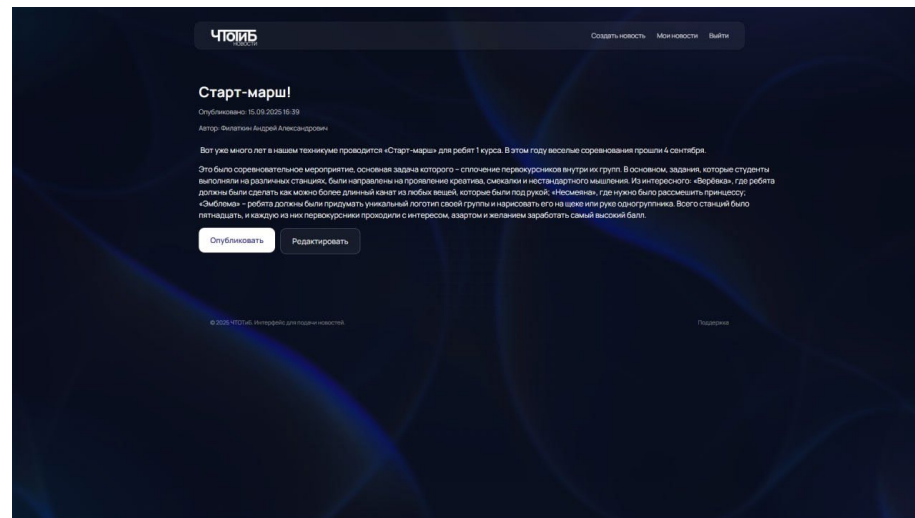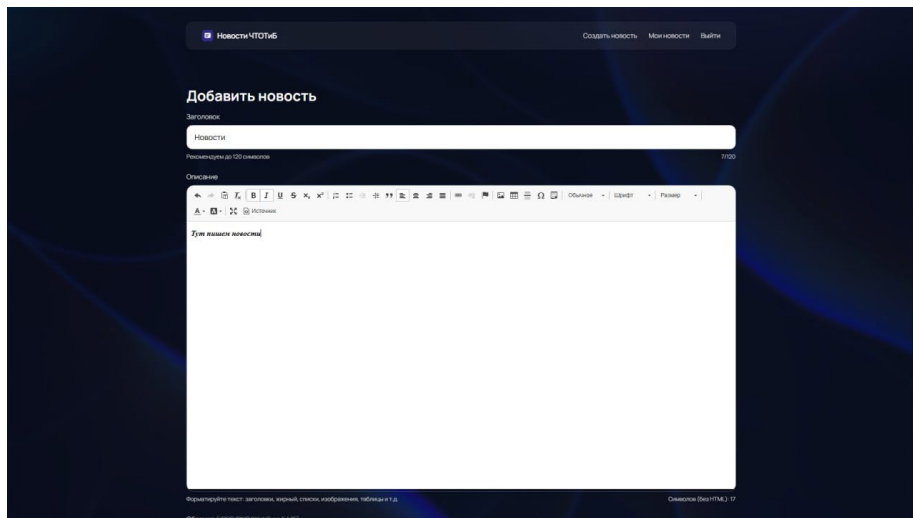

Достижение целевых показателей

Наименование показателя	Текущий	Целевой	Фактический	Эффективность, %
Вероятность ошибки при составлении новости, %	78	2	2	100%
Временные затраты IT-специалиста, мин.	16	0	0	100%
Процесс корректировки новостного контента, мин.	14	2	2	100%

Выполнение плана мероприятий
составило 100%

Эффективность по проекту – 100 %

Спасибо за внимание

Чумаков Никита Сергеевич
Руководитель отдела ИТ

Тел.: 8 (3022) 28-20-76 доб. 109
Моб. тел.: +7 (924) 813-31-11
E-mail: chumakov9696@gmail.com
www.chtotib.ru

06.06.2025
